

PROJEKTI TÄITMISE ARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

Muutramallitud
Fakt
5.10.01.

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Veekaitse nr 94



1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Endise NL armee hoidla likvideerimine
Tallinnas, Lauliku tn 4a nr 94

1.3 Tellija: Harjumaa Keskkonnateenistus

1.4 KIK`ga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number,
kuupäev: 01-01-3/49, 26. juuni 2001.a.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu nr ja kuupäev: nr 1/2 06. juuni 2001.a.

1.6 Töö teostaja: Kaitseliit- Nõmme malev

1.7 Projekti kavandatud algus: 01.juuni 2001.a. lõpp: 31. august 2001.a.

1.8 Töö/objekti või selle osa vastuvõtmise aeg: 17.september 2001.a.

1.9 Aruandeperioodil teostatud tööde maksuriskus ja selle jagunemine finantseerijate vahel.

Tööde teostamise periood (kuupäev/aasta)		KIK (EEK)		RIP (EEK)	Oma-valitsus (vee-ettevõtte) (EEK)	Välis-abi, -laen (EEK)	Muud (EEK)	Kõik kokku (EEK)
algus	lõpp	Alates projekti algusest	s.h aruande perioodil					
01.06	11.09	450 000	450 000					450 000

1.8 Projekti finants- ja muude dokumentide asukoht:
Harjumaa Keskkonnateenistus Viljandi mnt 16

SA K I K
SISSE TULNUD
02-10-2001
Nr. *03*

2. SISU

2.1 Projekti eesmärk: Jääkreostuse likvideerimine.

2.2 Teostatud tööde kirjeldus (hetkeseis):
Mahutipargi, kui reostuskolde likvideerimine

2.3 Keskkonnaalane tulemus: Jääkreostuse likvideerimine.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused (kirjeldused, põhjendused, uued tähtajad jne.):

Ei ole.

2.5 Tellija hinnang: hea

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Asutus/An etinimetus	Kuupäev
Tellijaga:	J.Pikka	Harju KKT juhataja	17.september 2001.a.
Aruande koostaja:	A.Leemet	Harju KKT peaspetsialist	17. september 2001.a.

4. KOOSKÕLASTUSED

Keskkonnaministeeriumi programmikoordinaator:

Maakonna keskkonnateenistus:

5. Aruande kohustuslikud lisad:

5.1 Töö üleandmise-vastuvõtmise akt 1 lehel

5.2 Aruanne teostatud tööde kohta 55 lehel, asub Harjumaa Keskkonnateenistuses Viljandi mnt 16

6. Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, töövõtja arved tellijale jms): asuvad Harjumaa Keskkonnateenistuses, Viljandi mnt 16

AKT

TÖÖDE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KOHTA

Lauliku tn. 4a kütusehoidla likvideerimine

Akt on koostatud 17.septembril 2001.a. lepinguliste tööde üleandmise-vastuvõtmise kohta.

Meie allakirjutanud, **TÄITJA**, AS EcoPro juhatuse esimees Neeme Reinap-i isikus ühelt poolt ja **TELLIJA**, Kaitseliidu ülem, kapten Benno Leesiku isikus teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et 15.juuni.2001.a. leping "Lauliku tn. 4a kütusehoidla likvideerimine" on täidetud nõuetekohaselt.

Tasumisele kuulub **TELLIJA** poolt lepingu järgi kokkulepitud summa nelisada üheksakümmend seitse tuhat nelisada viiskümmend krooni (497 450) krooni, s.h. käibemaks, millest:
135 000.- krooni on tasutud avansina
47 450.- krooni tasub garantiikirja alusel Kaitseministeerium
315 000.-, s.h. käibemaks jääb tasuda Kaitseliidul.

Lisa: 1. Tööde aruanne 55 lehel.
2. Arve

Andis üle

TÄITJA

Neeme Reinap



Võttis vastu

TELLIJA

Benno Leesik



AKT

TÖÖDE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KOHTA

Lauliku tn. 4a kütusehoidla likvideerimine

Akt on koostatud 17.septembril 2001.a. lepinguliste tööde üleandmise-
vastuvõtmise kohta.

Meie allakirjutanud, **TÄITJA**, Kaitseliidu ülem, kapten Benno Leesiku
isikus ühelt poolt ja **TELLIJA**, Harjumaa Keskkonnateenistuse juhataja
Jaan Pikka isikus teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et
15.juuni.2001.a. leping "Lauliku tn. 4a kütusehoidla likvideerimine" on
täidetud nõuetekohaselt.

Tasumisele kuulub TELLIJA poolt lepingu järgi kokkulepitud summa
nelisada viiskümmend tuhat krooni (450 000) krooni.

Lisa: tööde aruanne 55 lehel.

Andis üle

TÄITJA




Benno Leesik



Võttis vastu

TELLIJA

Jaan

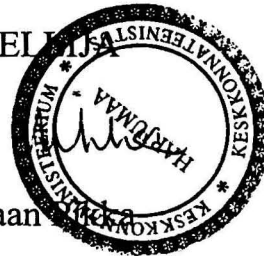

EELARVE TÄITMISE KOONDARUANNE

KUUPÄEV/AASTA: 17. september 2001.a.

PROJEKTI , TÖÖ VÕI TEGEVUSE NIMETUS En lise NL armee hoidla likvideerimine
Tallinnas, Lauliku 4a veekaitse projekt nr 94

TÖÖ TEOSTAJA: AS Estonian Air

TÖÖVÕTULEPINGU NR JA KUUPÄEV 2/1 24.05.2001.a.

NR	Otsesed ja kaudsed kulud (materjalide, tööde, seadmete, tegevuste vms kirjeldus või nimetus)	Eelarveline maksumus			Täidetud projekti algusest s.h aruandeperioodil tehtud tööd		Tehtud aruandeperioodil	
		Ühik (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Kokku krooni	% või tk, jm, r 3,tund jne	krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	krooni
1.	Vastavalt eelarvele ja arvetele							
2.								
3.								
....								
Kokku								
Käibemaks 18%								
Kokku koos käibemaksuga				450000				
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele				450000				

Märkused (selgitused muudatuste, kõrvalekallete ja ms kohta):

Lisa:

Töö teostaja: Neeme Reinap

(nimi, allkiri)

Tellijal: Aleksander Leemet

(nimi, allkiri)

JÄÄKREOSTUSE ALAPROGRAMMI

PROJEKTI KIRJELDUS

Projekt: Endise NL –armee kütuseoidla likvideerimine
Tallinnas, Lauliku tn. 4a

Taotleja: Kaitseliit

Tüüp: rakenduslik projekt

Projekti algus: 01.06.2001.a.

Projekti lõpp: 31.08.2001.a

Projekti ala: Tallinn

Administratiivne tase: regionaalne

Taotletav summa: 450 000.- krooni

1. Projekti taust (ülevaade probleemist ja tagamaadest, olukord enne projekti, hetkeseis jms., võimalikult detailne)	Tallinnas, Lauliku tn. 4a asub Kaitseliidu halduses endine Vene sõjaväe kütuseladu. Territooriumi suurus on 9 ha, kus paikneb 70 mahutit. Valdav osa neist on maaalused 50 m ³ mahutid, milles on õlijäätmeid. Esmase keskkonnakahjustuste inventuuri tegi 1994.a. AS Ehitusekspert. Lahtised ohtlikud jäätmed (kemikaalid, akud jne.) likvideeris 1997.a. OÜ Georemest. Seoses territooriumi kasutusele võtmisega Kaitseliidu väljaõppe baasina on vajalik mahutid likvideerida. Mahutid on paigutatud kõik ilma betoonaluseta liivapinnasesse, mistõttu ei ole välistatud pinnasereostus mahutite ümbruses.
2. Projekti eesmärk, sihtgrupp ja tulu (keskkonnakaitseline, rahaline, väljund)	Mahutipargi, kui reostuskolde likvideerimine. Tulu on keskkonnakaitseline.
3. Projekti tegevused ja kirjeldus etappide kaupa	<ol style="list-style-type: none">1. Mahutite (ca 70 tk.) tühjendamine õlijäätmetest ja mahutite pesu.2. Mahutite ja torustike väljakaevamine ja utiliseerimine.3. Reostusuuringud.4. Reostunud pinnase äravedu ja kompostimine.5. Kogu kaeveala täitmine ja tasandamine.

4. Projekti teostamise ja aruannete esitamise graafik	Tööde teostamine alates juunist kuni 31.august, aruande esitamine hiljemalt 15.september 2001.a.			
5. Projekti eelarve (kuluartiklite lõikes)		2000	2001 kuluartiklite lõikes (tuh.kr.)	
			Mahutip argi likvideer imne	Uuirng ud
	KIK		400	50
	RE			
	OV			
	Muud		50	
	Kokk		450	50
6. Projekti kirjeldavad lisad (eeluuringud, eelprojekt ja muud projekti iseloomustavad dokumendid)	AS Ehitusekserdi aruanne 1994.a., OÜ Georemest aruanne 1997.a. AS EcoPro ja AS Mavese 2000.a. tööde hinnang 2000.a.			

Taotleja kinnitus:
nimi, ametikoht allkiri kuupäev, aasta

Telefon:

Faks:

E-post:
